


Производство соломенных панелей, домокомплектов и строительство
"под ключ" экодомов по всей России.

Проект дома «Монако»



Смета на дом
100 м²

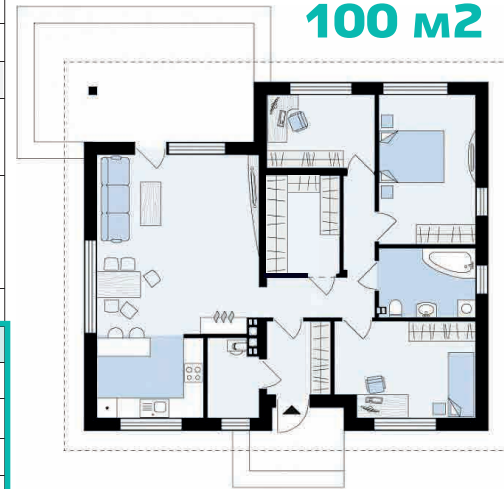

Фундамент	шт	цена	итого
ЖБК сваи 200x200x2.5 м	25	6 500р.	162 500р.
Усиленные оголовки 200 x 200 мм (8 мм)	30	3 000р.	90 000р.
Силовой каркас и стены м³			
Обвязочный брус ГОСТ для внешних стен 200x200 мм (45 м x 2 ряда = 90 м)	4	23 000р.	92 000р.
Обвязочный брус ГОСТ для внутренних стен и перегородок 150x150 (12 м x 3 = 36 м, 11 м x 4 = 44 м, 80 м)	2	23 000р.	46 000р.
Балки (брус и доски ГОСТ различных сечений)	5	23 000р.	115 000р.
Стены, пол и потолок			
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО			
Стены из соломенных панелей толщиной 40 см	119	5 000р.	595 000р.
Пол из соломенных панелей толщиной 40 см	117,56	5 500р.	646 580р.
Потолок из соломенных панелей толщиной 40 см	117,56	5 500р.	646 580р.
Перегородки из соломенных панелей толщиной 15см	123	4 000р.	492 000р.
Крыша шт/м²			
Стропильная система	150	2 500р.	375 000р.
Мягкая кровля	150	3 500р.	525 000р.
Отделка			
Материал глиняно(песчано)-известковая штукатурка		30 000р.	30 000р.
Работа штукатурка	480	450р.	216 000р.
Доставка домокомплекта из панелей	1		40 000р.
Окна с двухкамерным стеклопакетом м² (14мх1,4м ~20м²)			
Пластиковые (стеклопакет 2-х камерный 36мм с энергосберегающим стеклом)	20	10 000р.	200 000р.
Двери м²			
Дверь входная	1	20 000р.	20 000р.
Технические системы м²			
		цена	всего
Электрика (разводка под ключ)	100	1 500р.	150 000р.
Сантехника (разводка под ключ)	100	1 500р.	150 000р.
Работы шт/м²			
Монтаж силового каркаса и панелей	100	3 000р.	300 000р.
Итого: 5 950 160р.			

Проектирование и строительство бань, летних кухонь, гаражей, пристроек. У нас есть типовые проекты домов, которые уже подготовлены и оптимизированы под строительство из соломенных панелей. Кроме того мы можем оптимизировать и ваш проект или сделать проект с нуля.



+7 961 870 80 90 ☎

экосено.рус
